


Prosjektnavn:	Datadeling i høyere utdanning og forskning
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Sigurd Eriksson
Prosjektleder:	Per Hovde
Rapportdato	12.05.2020

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Yellow	Yellow	Yellow
Økonomi	Green	Green	Green
Ressurser	Yellow	Yellow	Yellow
Kvalitet	Green	Yellow	Green
Avhengigheter	Green	Yellow	Yellow
Risiko	Green	Yellow	Yellow

Oppsummering
<ul style="list-style-type: none"> • Jobber med forankring av leveranseplanens innhold og få tilgang til nødvendige ressurser for å oppfylle den. • Prosjektstyre under etablering • Styringsdokument under utarbeidelse

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeidet og forankret innhold i leveranseplan i prosjektgruppa • Gjennomgang av sluttrapport fra evaluering av FS 	<ul style="list-style-type: none"> • God prosess • Gartners anbefalinger i tråd med prosjektets konseptuelle målsetninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Vanskelig å få tilgang på ressurser med inngående kompetanse på UH:IntArk (UiO) • Teknologi- og produktvalg i UH:IntArk ikke helt i tråd med Gartners anbefalinger • Avhengighet til valg som gjøres for modernisering av FS 	<ul style="list-style-type: none"> • Forankring av leveranseplanen mht. ressurser og omfang av leveranser. • Godkjenning av leveranseplanen i prosjektstyret

Risikovurdering

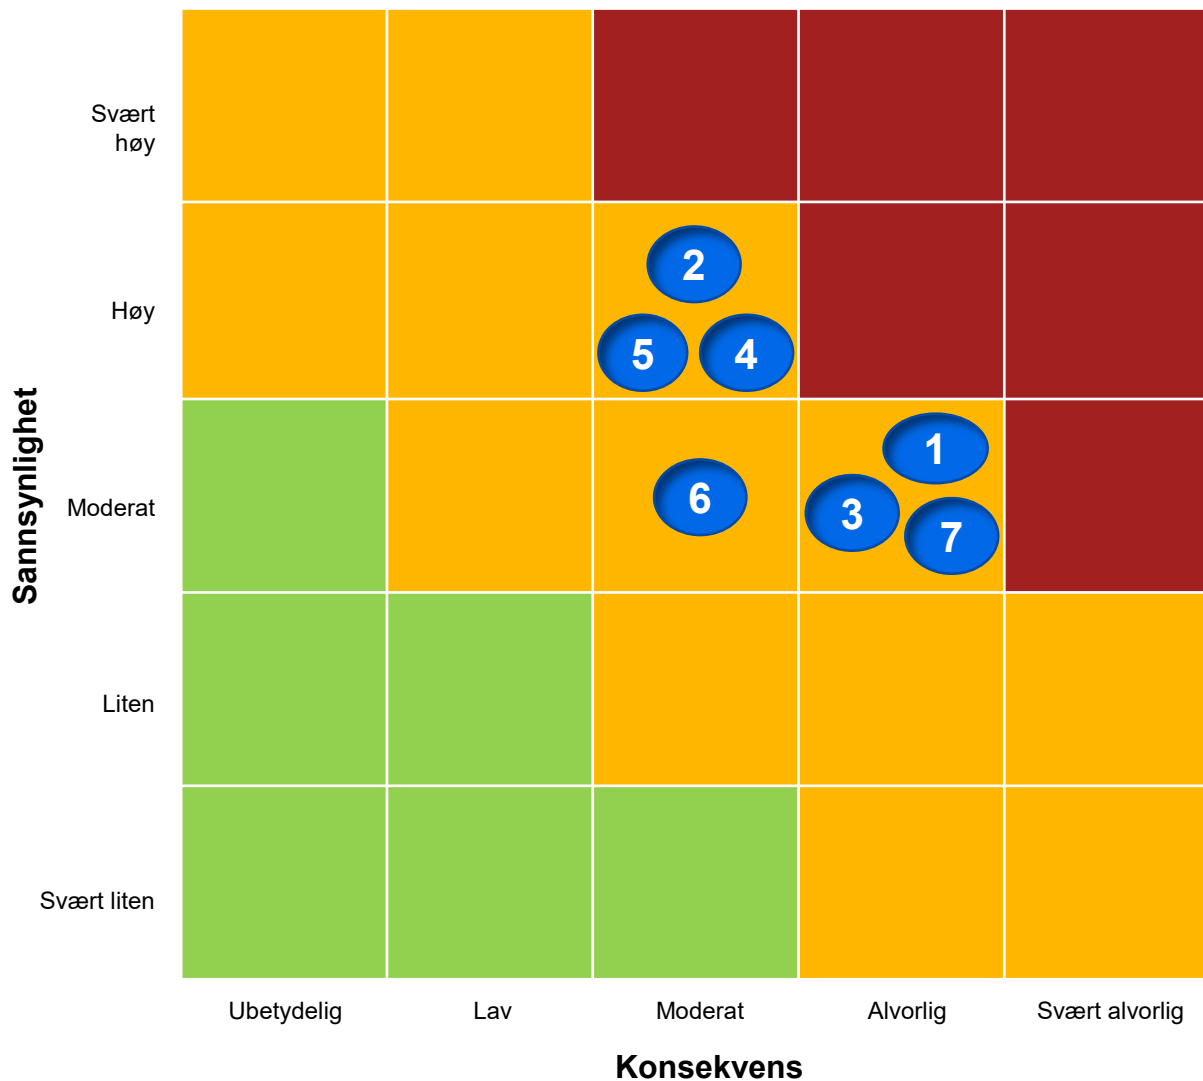

	Risikoelementer
1	Prosjektet får ikke tilgang til kritiske ressurser (UH:IntArk-kompetanse)
2	Covid-19 krisen gir endrede prioriteringer i institusjonene som går på bekostning av innsats i prosjektet
3	Utfordringer med å integrere UH:IntArk med nasjonale felleskomponenter for autentisering og autorisering
4	API'er mot sentrale tjenester i sektoren er for generelle og lite use case sentriske og kostnadsdrivende mht. å lage rollebaserte tjenester
5	Konsekvenser av å innføre UH:IntArk relatert til at integrasjoner i sektoren levert av Unit er basert på en annen teknologiplattform
6	Gartners anbefalinger ifm. evaluering av FS peker i en litt annen retning for teknologivalg enn UH:IntArk og en bør enes om én felles plattform
7	Økt deling av data krever større fokus på begrepsharmonisering og – differensiering og fokus på MDM etter hvert som behov for dette avdekkes. Risiko knyttet til tilgang til ressurser.
8	
9	
10	

