

Prosjektnavn:	Fellestjeneste beslutningsstøtte
Ansvarlig virksomhet:	Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	08.05.2020

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Green	Yellow	Yellow
Ressurser	Green	Green	Green
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Green	Green	Green
Risiko	Green	Green	Green

Oppsummering


30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er planlagt i fase 1 (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Oppnevnt styringsgruppe og prosjektgruppe med møteplan for hele 2020 • Prosjektgruppen har hatt første møte med gjennomgang av hva som skal leveres og veien videre • Prosjektgruppen er delt opp i 4 arbeidsgrupper for ulike administrative forretningsområder • Utsendt maler for registrering av datasett og datakilder som skal inngå i fellesløsning 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiv stemning i prosjektgruppen for det oppdraget gruppen skal utføre • Leverandør BI Builders har gjenskapt Units leveranse til UiT og deler av DFØ-leveransen til UiO-UiB gjennom sitt verktøy BI Builders i en PoC. Ansatte i Seksjon for dataanalyse og beslutningsstøtte har testet verktøyet og gjennomgått produktet som er levert. • Etablert kontakt med Gartner Analyst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenset økonomi i prosjektet • Begrenset utrederkompetanse i prosjektet • Komplekst område med mange valgmuligheter 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 arbeidsgrupper skal vurdere hvilke datasett og datakilder de ønsker tilgjengeliggjort gjennom løsningen • Gartner analyst samtale

Risikovurdering

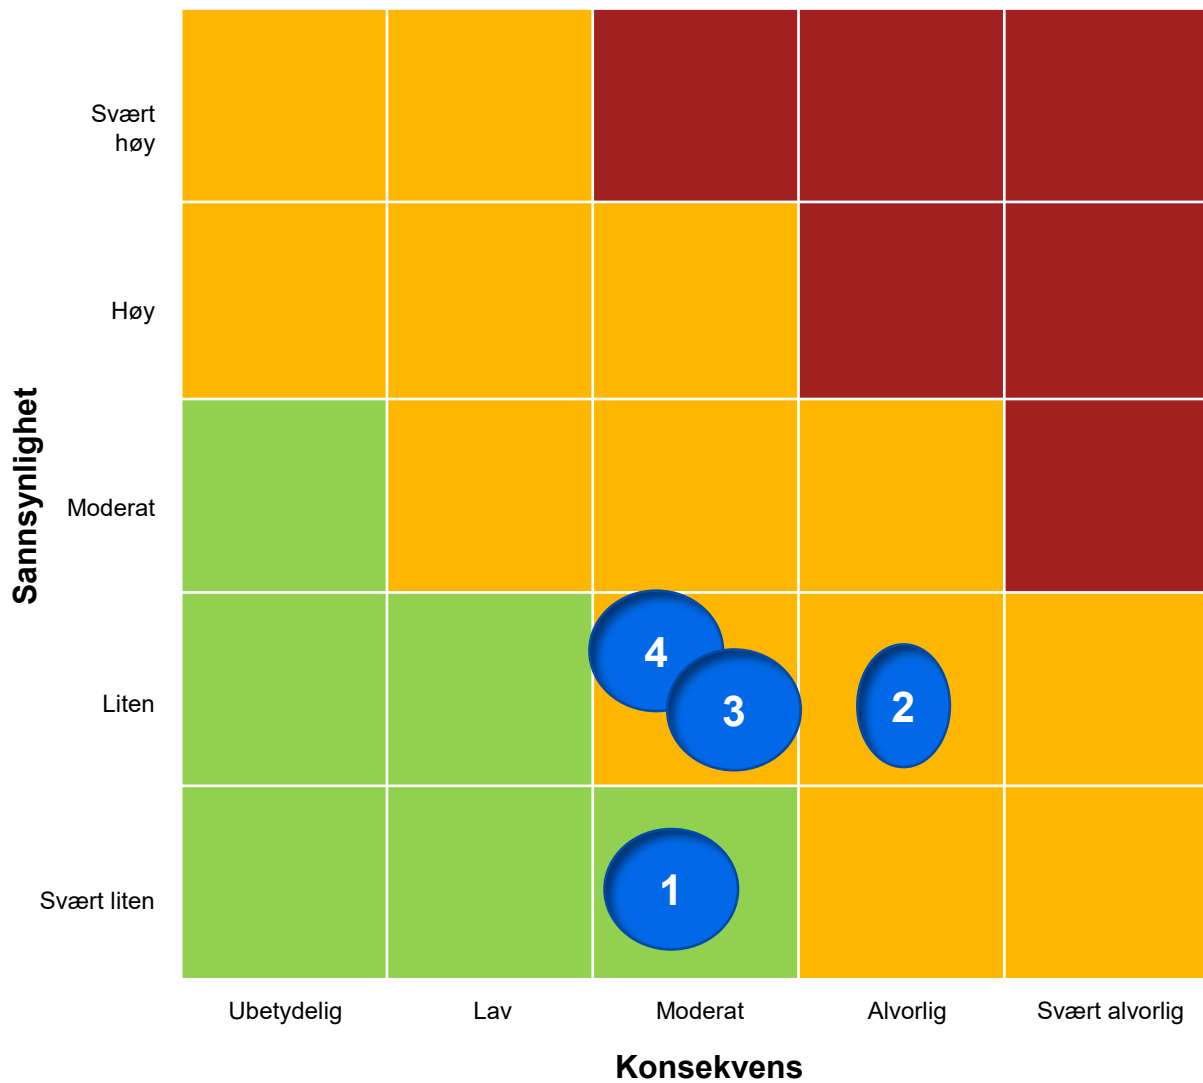

	Risikoelementer
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov
2	Manglende ressurser i prosjektet
3	Manglende fremdrift i prosjektet
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet
5	
6	
7	
8	
9	
10	

