

<b>Prosjektnavn:</b>	Fellestjeneste beslutningsstøtte
<b>Ansvarlig virksomhet:</b>	Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
<b>Prosjekteier:</b>	Anders Hansteen Reitan
<b>Prosjektleder:</b>	Ole Martin Nodenes
<b>Rapportdato</b>	20.10.2020

	Forrige	Nå	Trend
<b>Fremdrift</b>	■	■	■
<b>Økonomi</b>	■	■	■
<b>Ressurser</b>	■	■	■
<b>Kvalitet</b>	■	■	■
<b>Avhengigheter</b>	■	■	■
<b>Risiko</b>	■	■	■

## Oppsummering

30. januar tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er planlagt i Planleggingsfasen (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Prosjektgruppen er i gang med denne jobben.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen har hatt 3 møter</li> <li>• Prosjektgruppen har etablert <i>Mulighetsrommet</i> for Verdibidrag for analyse, rapportering og beslutningsstøtte, samt Tidskritikalitet.</li> <li>• Testet datavarehus-teknolog i sky; Snowflake</li> <li>• Utkast til Styringsdokument diskutert med styringsgruppe og fagutvalg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positiv stemning i prosjektgruppen</li> <li>• Fagutvalget følger prosjektet tett</li> <li>• Bistand fra Gartner med å etablere Mulighetsrom for tjenesten og kostnadsestimering av prosjektet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere pågående prosjekter/initiativer berører prosjektet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlegge gjennomføringsprosjekt</li> <li>• Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT</li> <li>• Forankre styringsdokument</li> <li>• Avklare forhold til prosjektet «Infrastruktur for datadeling»</li> </ul>

## Avhengigheter til Datadelingsprosjekter i kunnskapssektoren

- Prosjektene kan tilby infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Fellestjeneste beslutningsstøtte. Avhengighet vil ev. oppstå i gjennomføringsfase.

## Avhengigheter til Datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT med økonomidata fra DFØ


- Overlapp for fagområdet *Økonomistyring* i det definerte *Mulighetsrommet* for tjenesten. Ingen avhengighet, men bl.a. datamodellering fra prosjektet kan ev. gjenbrukes av Fellestjeneste beslutningsstøtte i gjennomføringsfasen.

## Avhengigheter til Masterdatamanagement-prosjekter

- Ingen avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkret masterdatakilder når de foreligger.



# Risikovurdering

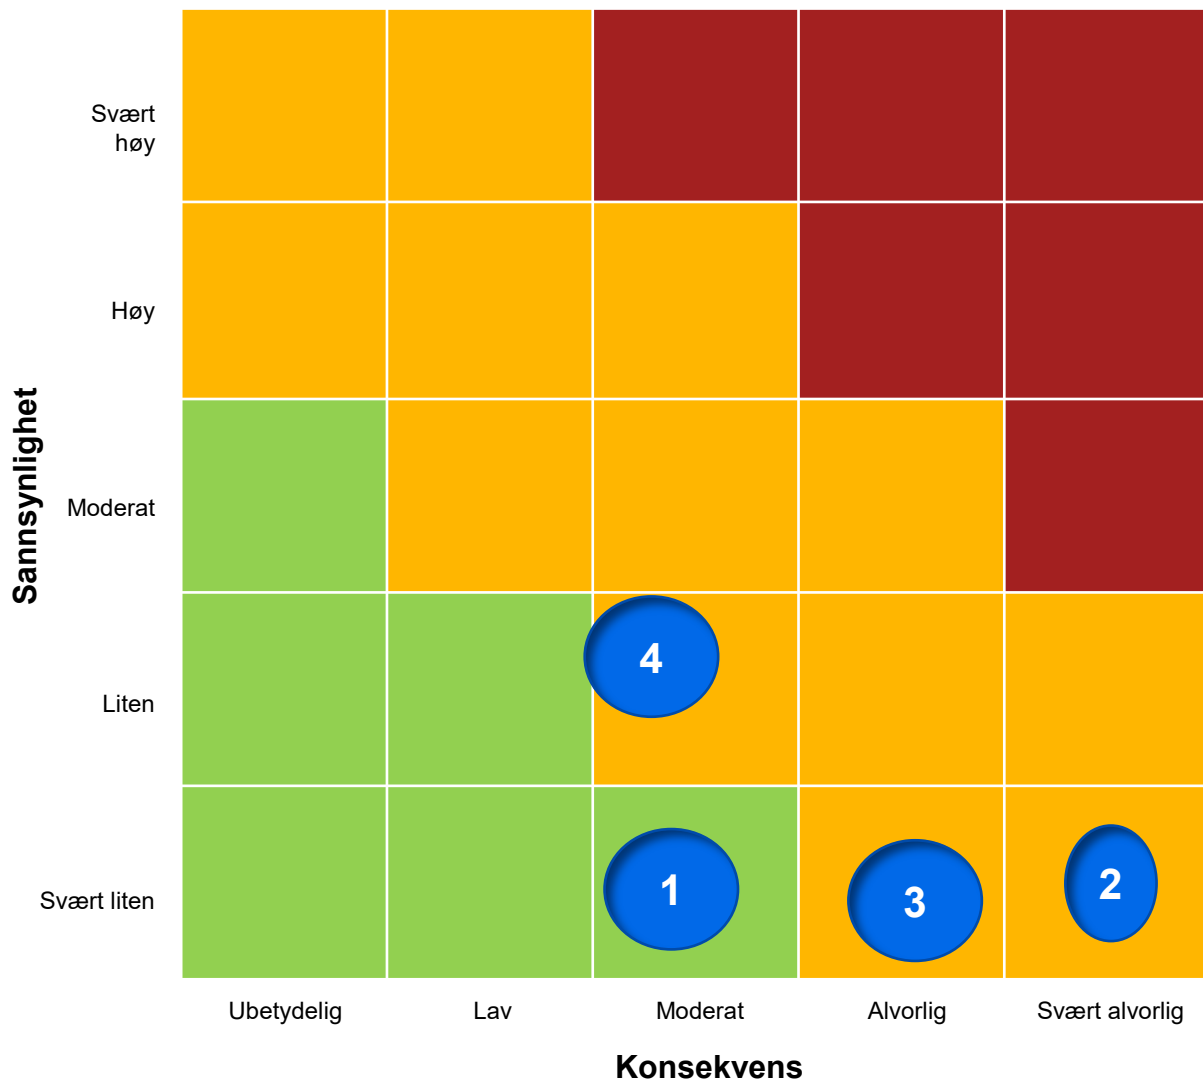

	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov	
2	Manglende ressurser i prosjektet	
3	Manglende fremdrift i prosjektet	
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

