

Prosjektnavn:	Felles IAM
Ansvarlig virksomhet:	Uninett AS
Prosjekteier:	Hildegunn Vada
Prosjektleder:	Kjell J Sivertsen
Rapportdato	14.01.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Yellow	Yellow	Yellow
Økonomi	Green	Green	Green
Ressurser	Yellow	Yellow	Green
Kvalitet	Yellow	Yellow	Green
Avhengigheter	Yellow	Green	Green
Risiko	Yellow	Yellow	Yellow

Oppsummering

«On-premise» plattformen til erstatning for AWS er etablert. Koden som er realisert i AWS, blir løftet over den 15/1-21. Det er fortsatt mye kode som skal realiseres. Dette vil bli realisert etter en Agil tilnærming, da det endelige løsningsdesignet for granulert tilgangsstyring ikke er endelig satt.

Som følge av den påkrevde omlegging fra en AWS - til On-Premise løsning ble det nødvendig å replanlegge hele implementeringsløpet.

Uninett tar frem Account Claim funksjonaliteten som inneholder integrasjonen med IDPorten. Løsningen er under ferdigstilling.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Det er kjørt kartleggingsmøter med flere av de øvrige institusjonene i sektoren. • En Utrullingsstrategi er under utarbeidelse. • Leverandøren har avholdt en demo for hvordan Org-Era (den nødvendige granulert tilgangsmetodikken) kan realiseres (Denne løsningen er basert på andre prinsipper enn det som ble rapportert sist.) • UiB har stilt en plattform til disposisjon til erstatning for AWS som utgikk pga. «Schrems II». Basisprogramvaren RI er installert på anlegget. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meget godt samarbeid mellom hovedprosjekt og UiB piloten. • Det er etablert en executive kommunikasjonskanal mellom Uninetts- og leverandørens ledelse for å best mulig ivareta utviklingen av produkt i tråd med Uninetts behov. • Det virker som at leverandøren nå har akseptert viktigheten av kravet om granulert tilgangsstyring 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har erfart at RI produktet ikke har innbygd en av de funksjonene som norsk UH sektor trenger: Granulert tilgangsstyring. Dette kan realiseres i løsningen ved kode, men det er en forventning at leverandøren utvider RI produktet med denne funksjonaliteten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er nå inne i en ny utviklings/leveranse/test periode hvor leveransene vil komme sprintvis hver uke. • Merk: IA vil ikke få tilgang til produksjonsdata uten at de er sammen med repr. fra UiB/Uninett i om. de er underlagt FISA sec 702.


“Felles IAM’s” avhengigheter til andre:

UiB piloten	UNIT	Sektoren generelt
<ul style="list-style-type: none">• UiBs miljø er rammen for 1. generasjon av “Felles IAM”. Dette betyr at alle systemer og miljøer hos UiB er av stor betydning for både hva som realiseres og hvordan det blir realisert.• BOTT, IntArk, MDM	<ul style="list-style-type: none">• Felles IAM er avhengig av at UNIT bidrar til at det kommer en forskrifts-/lovendringer som tillater lagring av UH-ID’er etter at studenter er ferdige med sine studie for å kunne understøtte ønsket om å understøtte «Livslanglæring» <p><i>Det virker ikke å komme en forskrifts-/ lovendring som understøtter Livslanglæring ila. våren</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Fellesløsninger i sektoren: DFØ SAP ØL, FS, ORGREG*, Humio, Cristin, ...• Andre løsninger som viser seg å være bredt anvendt i sektoren, men som kanskje ikke anvendes 100% likt: SAP, PAGA, ... <p><i>*) OrgReg har tilkommet som en bieffekt av SAP ØL</i></p>



Risikovurdering

(Risikobildet med endringer fra Nov.20)

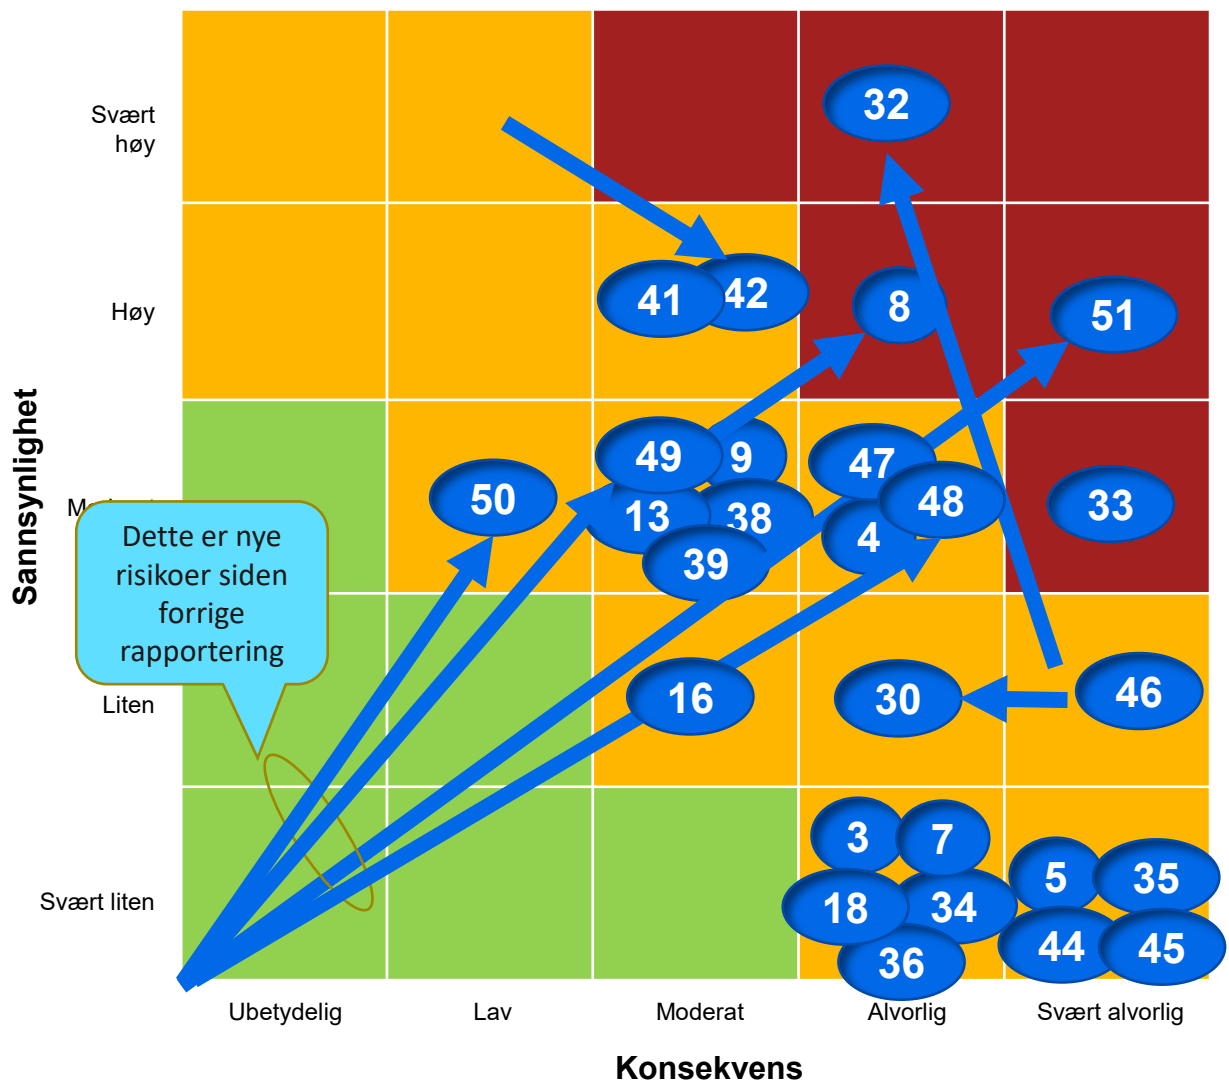

	Risikoelementer	Tiltak
51 Ny	Nødvendig RI produktutvikling lar seg ikke utvikle / realisere innen Pilotfasen hos UiB er over.	Sørge for at IA tar initiativ til et møte med Produktteamet som bekrefter fremdrift på dette. Dette spilles inn i 4/1 Sprint-møte
33	<u>Leverandøren virker å ha lite ressurser (a la Kris Hawxhurst)</u>	Så langt er det bekreftet at Kris skal forestå både utvikling og test.
32 Økt	Kulturforskjeller mellom USA og Norge (I undervisnings-sektoren og business wise) (Konsensus, privacy, ...)	Dette er der hele tiden, men kan være svært alvorlig dersom man ikke lykkes med å danne en felles plattform. Forståelse oppnås men det krever ofte avklaringer. Lage en beslutningslogg i Smartsheet
8 Økt	Manglende avgrensning av prosjektet, undervurderer kompleksiteten i prosjektet. Del 1: Utvikle løsningen Del 2: Forskjellene mellom institusjonene er for stor	Tydlig og avgrenset scope for pilot, tydelig og avgrenset scope for fellesintegrasjoner og -prosesser. Identifisere hvilke beslutninger prosjektet trenger og bringe disse til riktige beslutningstakere. God dialog med leverandøren.
46	Det kommer signaler om at FS-API'et ikke har den kvalitet og ytelse som er forventet	1) Sette opp en ytelses test så raskt som mulig 2) Vi initierer møte med UNIT (Gjennomført) 3) Sette opp en Sync db I prosjektet så kjøres FS først av Kildesystemene
41	Målsystemenes grensesnitt har mangler som medfører forsinkelse i hovedprosjektet	F.eks. Mule ligger i mellom: Her trengs en hurtig løsning fra Unit... Konfigurasjonsstyring og bedre kartlegging i forkant av nye
42 Red	Manglende konfigurasjonstyring leder til at løsningen mister sin standardisering	Konfigurasjonplan / generasjonstankegang / generation management plan. Bruke GitLab, men det må lages rutiner over dette Connect-koden skal være lett flyttbar mellom institusjonene.
47 Ny	Medarbeidere i UiB blir sliten av den høye belastningen og de korte (urealistisk) tidsfristene	Justerer tidsfristen, men det blir nok tøft fremover Kyle må være med fra Januar '21
48 Ny	Økonomi/SAP medarbeider/eksperter blir svært opptatt i des/jan pga SAP ØL	SAP testing i IAM flyttes etter FS for å gi mer tid.

Forklaring: De øvrige risikoene har lavere risikoverdier
Ny – En Ny risiko som er identifisert siden forrige rapportering
Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering

