

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Prosjektnavn:         | Nasjonalt masteropptak |
| Ansvarlig virksomhet: | BOTT/Unit              |
| Prosjekteier:         | Studie-BOTT            |
| Prosjektleder:        | Camilla Haugland       |
| Rapportdato           | 15.4.2021              |

## Oppsummering

Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående prosjekter og hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen og implementering av nasjonalt masteropptak. Det har videre med planlegging og forankring, samt innen de ulike leveranseområdene i prosjektet. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og vil bli fulgt opp i neste periode. Prosjektet har fått en avklaring på regnskapsmessig håndtering (mva).

|               | Forrige | Nå     | Trend  |
|---------------|---------|--------|--------|
| Fremdrift     | Green   | Green  | Green  |
| Økonomi       | Orange  | Green  | Yellow |
| Ressurser     | Green   | Green  | Green  |
| Kvalitet      | Green   | Green  | Green  |
| Avhengigheter | Yellow  | Yellow | Yellow |
| Risiko        | Yellow  | Yellow | Yellow |

| Aktiviteter Utført  | Positivt   | Bekymringer  | Neste Periode  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobbet med rammebetingelser, ressursavklaringer og planverk</li> <li>• Forankring hos ulike interessentgrupper</li> <li>• Behovskartlegging med ulike brukergrupper gjennomført</li> <li>• Ekstern kvalitetssikring ferdig</li> <li>• Arbeid innen de ulike leveranseområdene</li> <li>• mva-problematikk avklart</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektgruppen har god fremdrift og holdningene og stemningen i gruppen er positiv</li> <li>• Ekstern kvalitetssikring avdekket ingen store mangler i prosjektet</li> <li>• Positiv innstilling i møter med interessenter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk vilje og kapasitet i KD til å til prioritere arbeid med felles nasjonal forskrift, og konsekvenser dette får for implementeringstidspunkt.</li> <li>• Prosjektet er avhengig av at teknisk utvikling av løsninger tilpasset masteropptak prioriteres i Unit, og at fremtidige opptakssystemer tilpasses alle typer opptak som gjøres i sektoren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kobling til moderniseringsprosjektet for opptakssystemer og avhengigheter mellom prosjektene</li> <li>• Forankringsarbeid</li> <li>• Oppfølging ekstern kvalitetssikring</li> <li>• Oppfølging behovskartlegginger</li> <li>• Arbeid med de ulike leveranseområdene i prosjektet</li> <li>• Ferdigstille avtaler mellom uio og Unit ifht prosjektgjennomføring</li> </ul> |

## Avhengigheter innen Unit

- Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling for at tidsplan skal kunne overholdes.
- Prosjektet er tett koblet til modernisering av opptakssystemene som helhet, og avhengig av tydelige linjer og ansvarsfordeling mtp teknisk utvikling av nye løsninger

## Avhengigheter til BOTT-SA


- Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i prosjektet.

## Avhengigheter til KD

- Prosjektet er avhengig av en avklaring med Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger, og at KD følger opp forslag fra prosjektet



# Risikovurdering

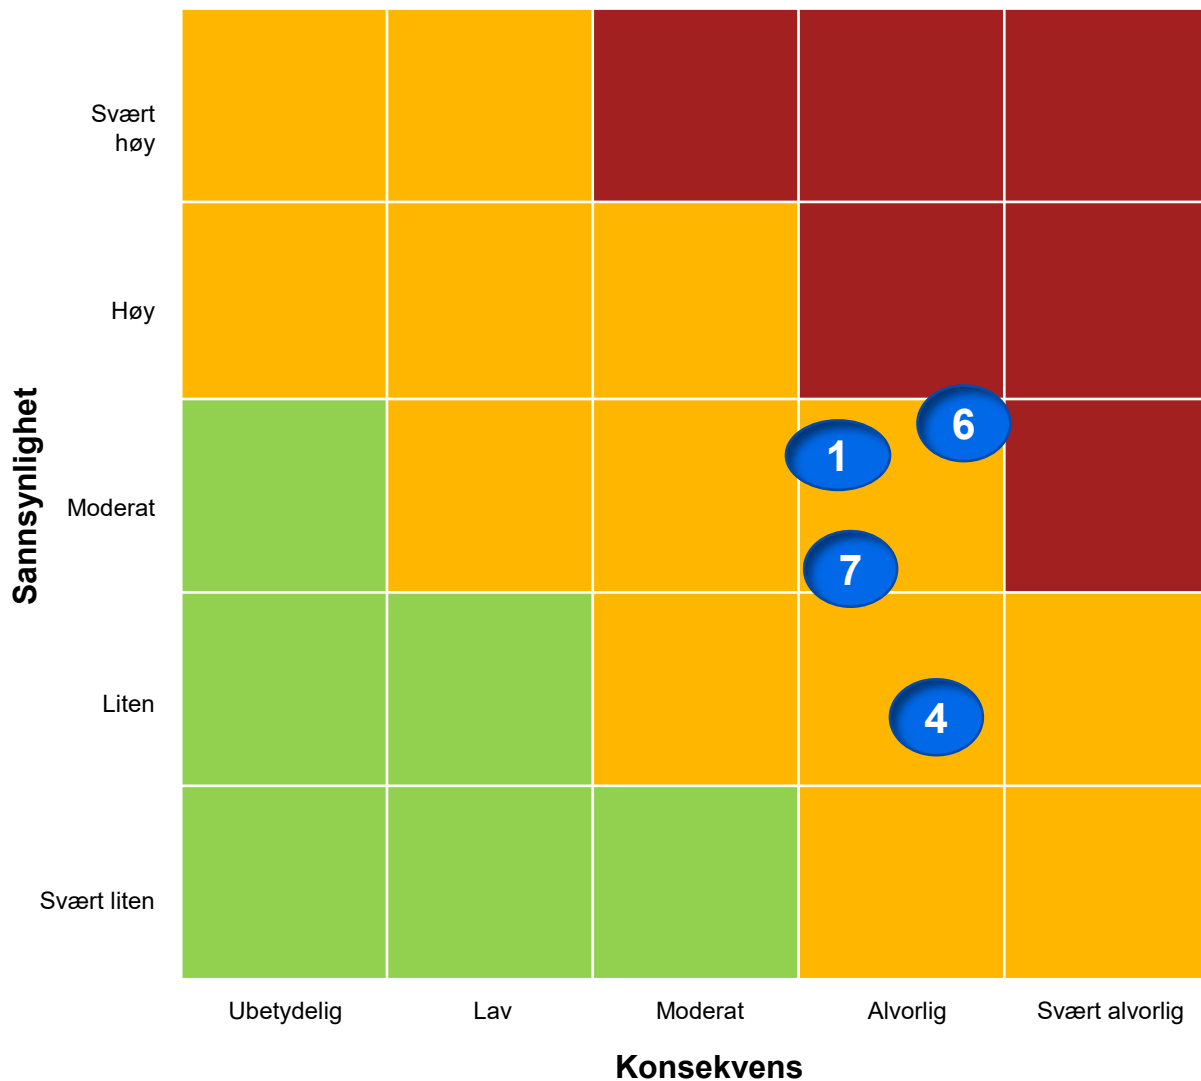

|   | Risikoelementer  | Tiltak  |
|---|--|---|
| 1 | Omprioritering av ressurser i Unit for utvikling, deltakelse og oppfølging av prosjektet. Avhengighet til moderniseringsprosjektet for opptakssystemene. | Pågående dialog med Unit.                               |
| 4 | Manglende forankring hos beslutningstakere   | Prosjektet gjennomfører informasjonsarbeid på alle nivå |
| 6 | Manglende kapasitet og/eller beslutningsvilje i Kunnskapsdepartementet for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger           | Pågående dialog med KD                                  |
| 7 | Beslutning om samordningsgrad blir ikke tatt på riktig nivå  | Forankring og avklaring                                 |

