

Prosjektnavn:	Nasjonalt masteropptak
Ansvarlig virksomhet:	BOTT/Unit
Prosjekteier:	Studie-BOTT
Prosjektleder:	Camilla Haugland
Rapportdato	15.1.2021

Oppsummering

Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående prosjekter og hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen av prosjektet og implementering av nasjonalt masteropptak. Det har også vært jobbet med gevinster og gevinstplaner, planlegging, planverk og forankring. Resultatene av kartleggingsundersøkelse er sammenstilt, og danner grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Kartlegging av brukerbehov i nye tekniske løsninger er igangsatt, og vil bli gjennomført i løpet av våren.

Teknisk utvikling er utsatt, jf. DS 65/20.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Red	Orange	Yellow
Ressurser	Yellow	Yellow	Yellow
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Yellow	Yellow	Yellow
Risiko	Yellow	Yellow	Yellow

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Jobbet med rammebetingelser, ressursavklaringer og planverk Gevinstberegninger Dialog med KD Forankring hos ulike interessentgrupper Gjennomgang og sammenstilling av resultater fra kartlegging på lærestedene Forberedt behovskartlegging med ulike brukergrupper 	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektgruppen har god fremdrift og holdningene og stemningen i gruppen er positiv Positiv holdning til prosjektet i KD 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk vilje og kapasitet i KD til å til prioritere arbeid med felles nasjonal forskrift, og konsekvenser dette får for implementeringstidspunkt. 	<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstille styringsdokument og gevinstplan Kobling til moderniseringsprosjektet for opptakssystemer og avhengigheter mellom prosjektene Forankringsarbeid Ekstern kvalitetssikring Møte i styringsgruppen Behovskartlegging med ulike brukergrupper

Avhengigheter innen Unit

- Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling for at tidsplan skal kunne overholdes.
- Prosjektet er avhengig av en avklaring av forholdet til utvikling av systemer for opptak til grunnutdanninger

Avhengigheter til BOTT-SA


- Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i prosjektet.

Avhengigheter til KD

- Prosjektet er avhengig av en avklaring med Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger



Risikovurdering

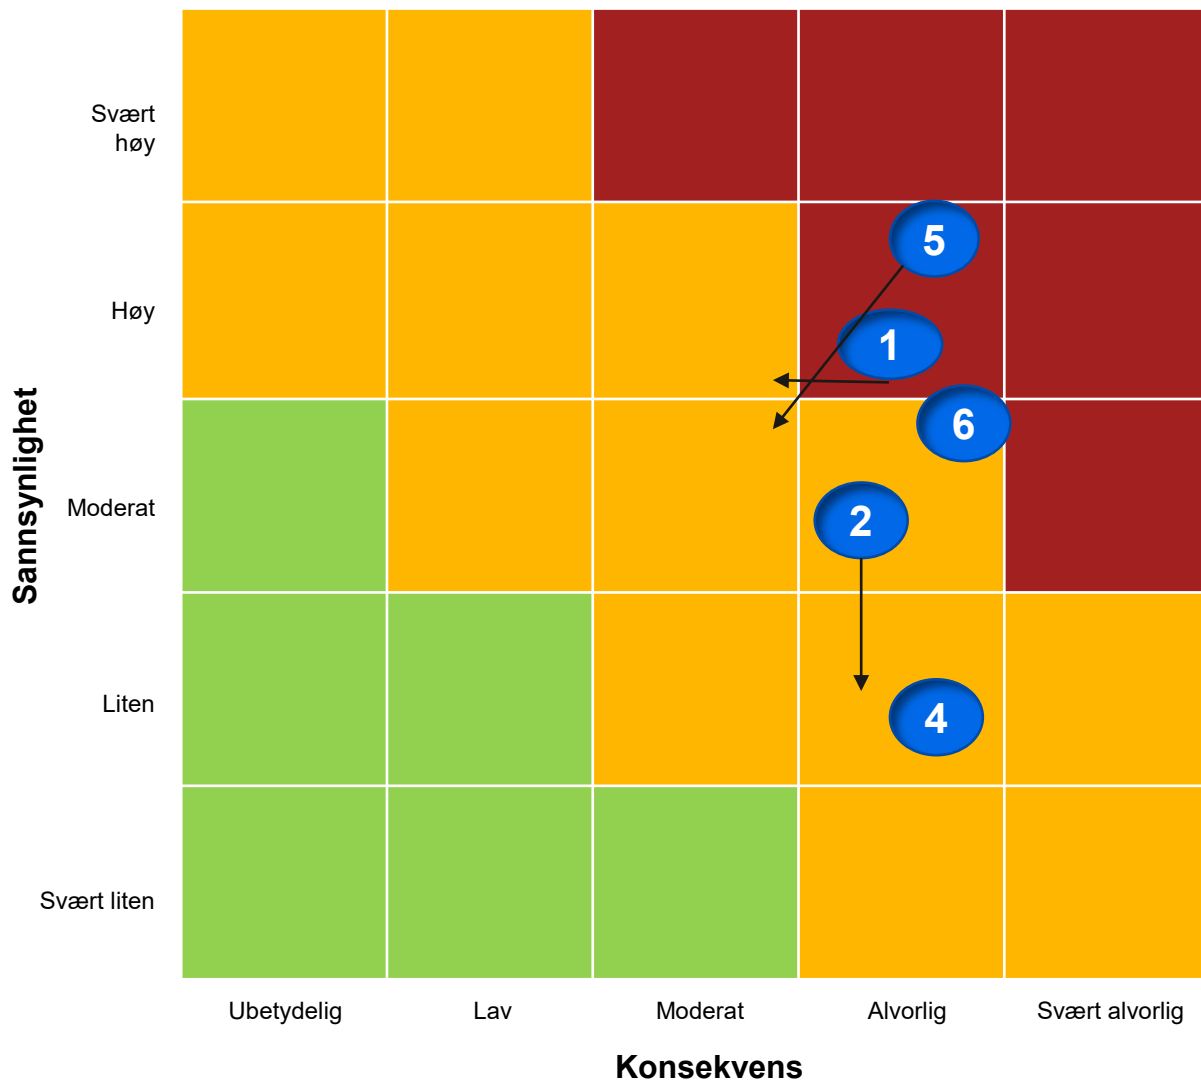

	Risikoelementer	Tiltak
1	Omprioritering av ressurser i Unit for utvikling, deltakelse og oppfølging av prosjektet. Avhengighet til moderniseringsprosjektet for opptakssystemene.	Pågående dialog med Unit.
2	Uklarheter og ulike oppfatninger av hva prosjektet skal levere	Fokus på arbeid med mål og gevinster, og forankring av disse på alle nivå.
4	Manglende forankring hos beslutningstakere	Prosjektet gjennomfører informasjonsarbeid på alle nivå
5	Prosjektet ikke tilstrekkelig finansiert pga. endring i rammebetingelsene (mva)	Pågående avklaring av konsekvenser for prosjektet, og hvilke tiltak som kan iverksettes.
6	Manglende kapasitet og/eller beslutningsvilje i Kunnskapsdepartementet for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger	Pågående dialog med KD

