

Prosjektnavn:	Nasjonalt masteropptak
Ansvarlig virksomhet:	BOTT/Unit
Prosjekteier:	Studie-BOTT
Prosjektleder:	Camilla Haugland
Rapportdato	18.5.2021

## Oppsummering

Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående prosjekter og hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen og implementering av nasjonalt masteropptak. Det har også vært jobbet innen de ulike leveranseområdene i prosjektet, samt med planlegging av høstsemesteret og forankring av prosjektet.

Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og anbefalinger derfra er fulgt opp. Kartlegging av brukerbehov i nye tekniske løsninger med ulike brukergrupper er gjennomført, og resultatet jobbet videre med i samarbeid med Unit.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeid innen de ulike leveranseområdene</li> <li>Oppfølging ekstern kvalitetssikring og oppdatering av planverk</li> <li>Forankring</li> <li>Oppfølging behovskartlegginger fra ulike brukergrupper</li> <li>Avklaringer rammebetingelser og ressurser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosjektgruppen har god fremdrift og holdningene og stemningen i gruppen er positiv</li> <li>Ekstern kvalitetssikring avdekket ingen store mangler i prosjektet</li> <li>Positiv innstilling i møter med interessenter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politisk vilje og kapasitet i KD til å til prioritere arbeid med felles nasjonal forskrift, og konsekvenser dette får for implementeringstidspunkt.</li> <li>Prosjektet er avhengig av at teknisk utvikling av løsninger tilpasset masteropptak prioriteres i Unit, og at fremtidige opptakssystemer tilpasses alle typer opptak som gjøres i sektoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kobling til moderniseringsprosjektet for opptakssystemer og avhengigheter mellom prosjektene</li> <li>Forankringsarbeid</li> <li>Videre jobbing med brukerbehov (teknisk)</li> <li>Arbeid med de ulike leveranseområdene i prosjektet</li> <li>Ferdigstille avtaler mellom uio og Unit ifht prosjektgjennomføring</li> <li>Oppretting av referansegruppe</li> <li>Møte i styringsgruppen</li> </ul>

## Avhengigheter innen Unit

- Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling for at tidsplan skal kunne overholdes.
- Prosjektet er tett koblet til modernisering av opptakssystemene som helhet, og avhengig av tydelige linjer og ansvarsfordeling mtp teknisk utvikling av nye løsninger

## Avhengigheter til BOTT-SA


- Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i prosjektet.

## Avhengigheter til KD

- Prosjektet er avhengig av en avklaring med Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger, og at KD følger opp forslag fra prosjektet



# Risikovurdering

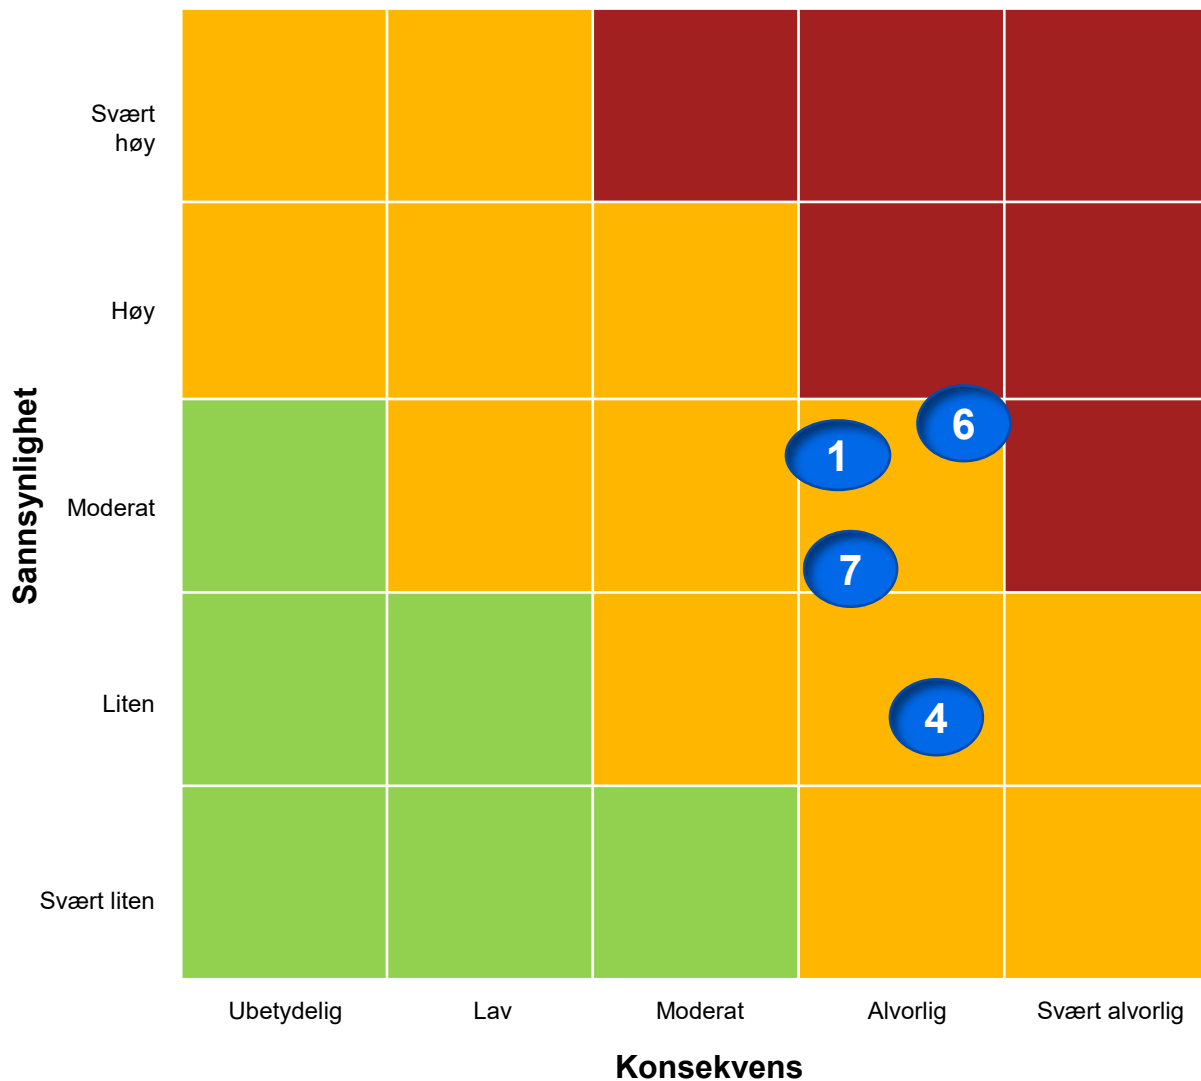

	Risikoelementer	Tiltak
1	Omprioritering av ressurser i Unit for utvikling, deltakelse og oppfølging av prosjektet. Avhengighet til moderniseringsprosjektet for opptakssystemene.	Pågående dialog med Unit.
4	Manglende forankring hos beslutningstakere	Prosjektet gjennomfører informasjonsarbeid på alle nivå
6	Manglende kapasitet og/eller beslutningsvilje i Kunnskapsdepartementet for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger	Pågående dialog med KD
7	Beslutning om samordningsgrad blir ikke tatt på riktig nivå	Forankring og avklaring

