

Prosjektnavn:	Nasjonalt masteropptak
Ansvarlig virksomhet:	BOTT/Unit
Prosjekteier:	Studie-BOTT
Prosjektleder:	Camilla Haugland
Rapportdato	15.3.2021

## Oppsummering

Prosjektet har jobbet videre med rammebetingelser for prosjektet, avhengigheter til andre pågående prosjekter og hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen og implementering av nasjonalt masteropptak. Det har også vært jobbet med gevinster og gevinstplaner, planlegging og forankring, samt vært jobbet innen de ulike leveranseområdene i prosjektet. Styringsgruppen har behandlet første versjon av styringsdokumentet.

Basert på en totalvurdering anbefaler styringsgruppen at prosjektet jobber mot at et felles regelverk kan vedtas i løpet av 2022, og at et første nasjonalt/felles opptak til masterstudier kan gjennomføres til studieåret 2024/25 (med åpning for søking høsten 23).

Det har vært jobbet med avklaringer rundt merverdiavgift, og det vil i løpet av kommende periode bli lagt fram en vurdering hvilke konsekvenser dette får for gjennomføringen av prosjektet.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Red	Yellow	Yellow
Ressurser	Yellow	Green	Green
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Yellow	Yellow	Yellow
Risiko	Yellow	Yellow	Yellow

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jobbet med rammebetingelser, ressursavklaringer og planverk</li> <li>Gevinstberegninger</li> <li>Forankring hos ulike interessentgrupper</li> <li>Behovskartlegging med ulike brukergrupper igangsatt</li> <li>Møte i styringsgruppen gjennomført, styringsdokumentet behandlet</li> <li>Ekstern kvalitetssikring igangsatt</li> <li>Arbeid innen de ulike leveranseområdene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosjektgruppen har god fremdrift og holdningene og stemningen i gruppen er positiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politisk vilje og kapasitet i KD til å til prioritere arbeid med felles nasjonal forskrift, og konsekvenser dette får for implementeringstidspunkt.</li> <li>mva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kobling til moderniseringsprosjektet for opptakssystemer og avhengigheter mellom prosjektene</li> <li>Forankringsarbeid</li> <li>Ekstern kvalitetssikring</li> <li>Behovskartlegging med ulike brukergrupper</li> <li>Arbeid med de ulike leveranseområdene i prosjektet</li> <li>Mva og konsekvenser for prosjektfinansieringen</li> </ul>

## Avhengigheter innen Unit

- Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling for at tidsplan skal kunne overholdes.
- Prosjektet er avhengig av en avklaring av forholdet til utvikling av systemer for opptak til grunnutdanninger

## Avhengigheter til BOTT-SA


- Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i prosjektet.

## Avhengigheter til KD

- Prosjektet er avhengig av en avklaring med Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger



# Risikovurdering

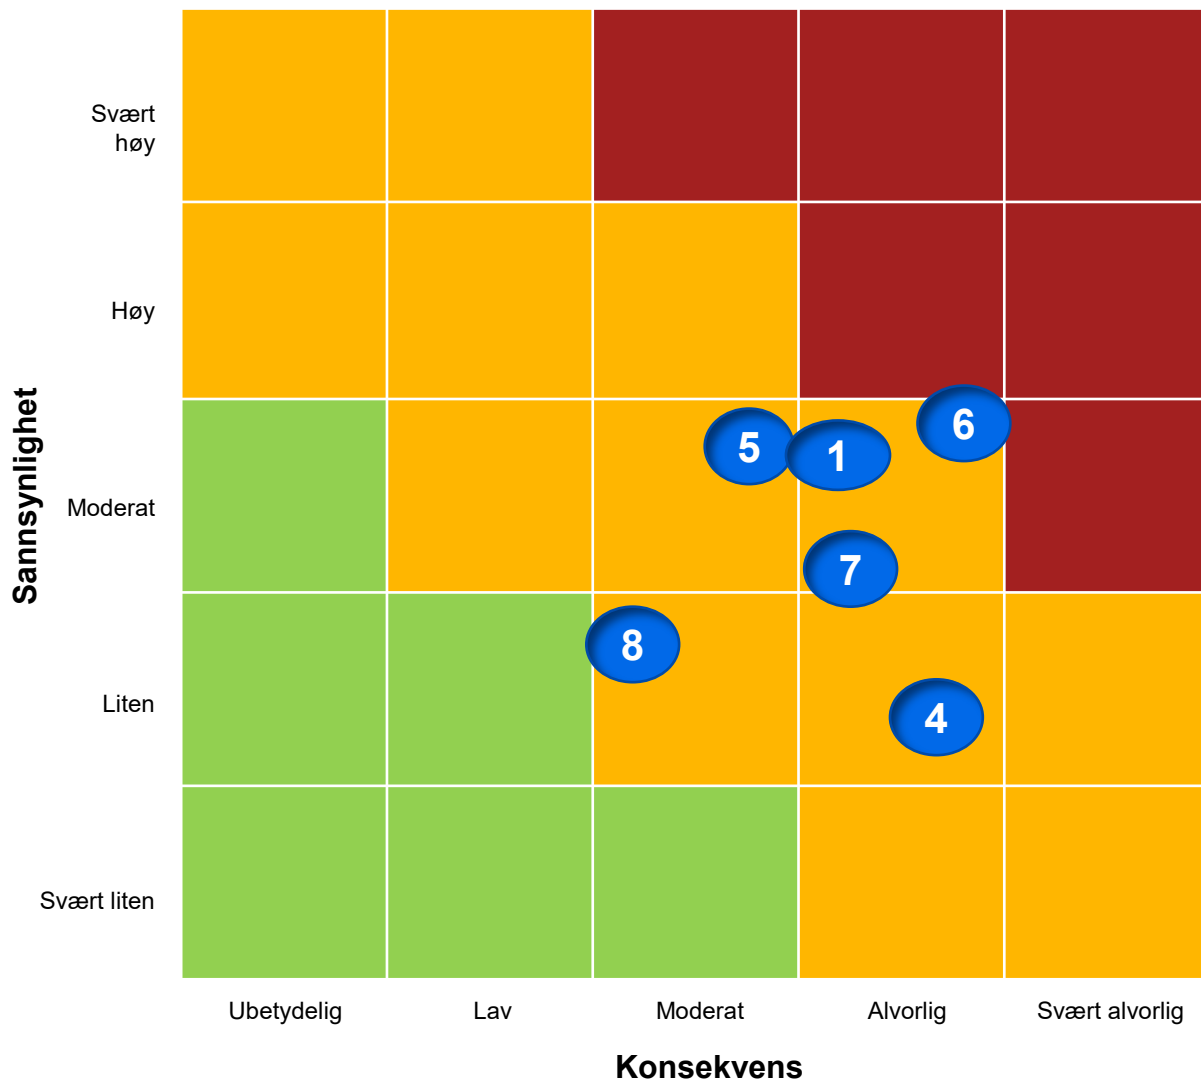

	Risikoelementer	Tiltak
1	Omprioritering av ressurser i Unit for utvikling, deltakelse og oppfølging av prosjektet. Avhengighet til moderniseringsprosjektet for opptakssystemene.	Pågående dialog med Unit.
4	Manglende forankring hos beslutningstakere	Prosjektet gjennomfører informasjonsarbeid på alle nivå
5	Prosjektet ikke tilstrekkelig finansiert pga. endring i rammebetingelsene (mva)	Pågående avklaring av konsekvenser for prosjektet, og hvilke tiltak som kan iverksettes.
6	Manglende kapasitet og/eller beslutningsvilje i Kunnskapsdepartementet for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger	Pågående dialog med KD
7	Beslutning om samordningsgrad blir ikke tatt på riktig nivå	Forankring og avklaring
8	Opptaksarbeid i sesong og uforutsett ekstraarbeid fører til at prosjektmedarbeidere ikke kan jobbe avtalt %	Pågående avklaring med lærestedene

