

## Oppsummering

Prosjektnavn:	DLR 2021
Ansvarlig virksomhet:	Unit
Prosjekteier:	Vegard Moen
Prosjektleder:	Christine Johnsen
Rapportdato	15.06.2021

### Nytt brukergrensesnitt

- Første versjon av brukergrensesnitt er ferdig (<https://dlr.unit.no/>)

### Informasjonsarbeid

- Møter med sektoren fortsetter (Stor interesse fra forskjellige nettverk)
- Webinar om lanseringen av DLR er gjennomført (07.09)
- Informasjonsfilm om DLR er ferdig og kan brukes av sektoren (<https://hdl.handle.net/11250/2761108>)
- Oppfølgingsarbeid med nettverk

### Utrulling sektoren

- Digsam-nettverk har besluttet å bruke DLR. (Digsam: <https://digsam.usn.no/>)

### Økonomi:

- Det ser ut til at vi er litt over budsjett per dags dato, men at dette vil dekkes inn av risikokapital

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

### Aktiviteter Utført

- Første versjon av brukergrensesnitt er ferdig
- Webinar om lanseringen av DLR er gjennomført (07.09 <https://hdl.handle.net/11250/2776350>)
- Møte med arbeidsutvalget til UHR utdanning (09.09)
- Møter med sektoren er i gang (Stor interesse fra forskjellige nettverk)
- Informasjonsfilm om DLR ferdig
- Oppfølgingsarbeid med nettverk
- Enkel integrasjon med Panopto er klar.
- Intern Risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS)

### Positivt

- Det er store delingsbehov på tvers i sektoren. Spesielt i nettverk og prosjekter.
- Nytt nettverk har valgt å ta i bruk DLR
- UHR utdanning skal sette ned en arbeidsgruppe som skal lage veiledende retningslinjer for deling (personvern og opphavsrett etc)

### Bekymringer

- Det er utfordring å få sektoren til å forplikte seg på kort tid
- Det vil fortsatt være behov for teknisk løft av DLR etter prosjektet er avsluttet
- Hvis mange ønsker å ta i bruk DLR på kort tid, med mange spesielle behov, kan det bli veldig tidkrevende

### Neste Periode

- Fortsette møter med institusjoner utover høsten om DLR
- Webinar-serie om ulike temaer (delingskultur, opphavsrett i DLR)
- ROS med sektoren
- Innlegg i DS (desember)
- Samarbeid med HK/dir/ UHR om delingskultur
- Fortsette å produsere blogginnlegg

## Avhengigheter innen [Virksomhet/inst.]

### NVA

- Har en del like brukstiltfeller, hvor det er ønskelig at disse tjenestene er gjenkjennbare. Det er ønskelig å ha en felles back-end med Bird og NVA (lagrer metadata og data(ressurs), tildeler DOI m.m.) ..

### VMS-tjenester

- Tjeneste levert av Unit for å gjøre videoopptak av undervisning
- Hvem har ansvar for nye integrasjoner?

### LMS-tjeneste

- Integrasjon med LMS, så man kan registrere/hente ressurser gjennom LMS

## Avhengigheter til [Prosjekt/program]


- Satsningsforslag til plattform for livslanglæring
- Datadelings-prosjektet og Datainfrastruktur KD

## Avhengigheter til [Prosjekt/program]

- ...



# Risikovurdering

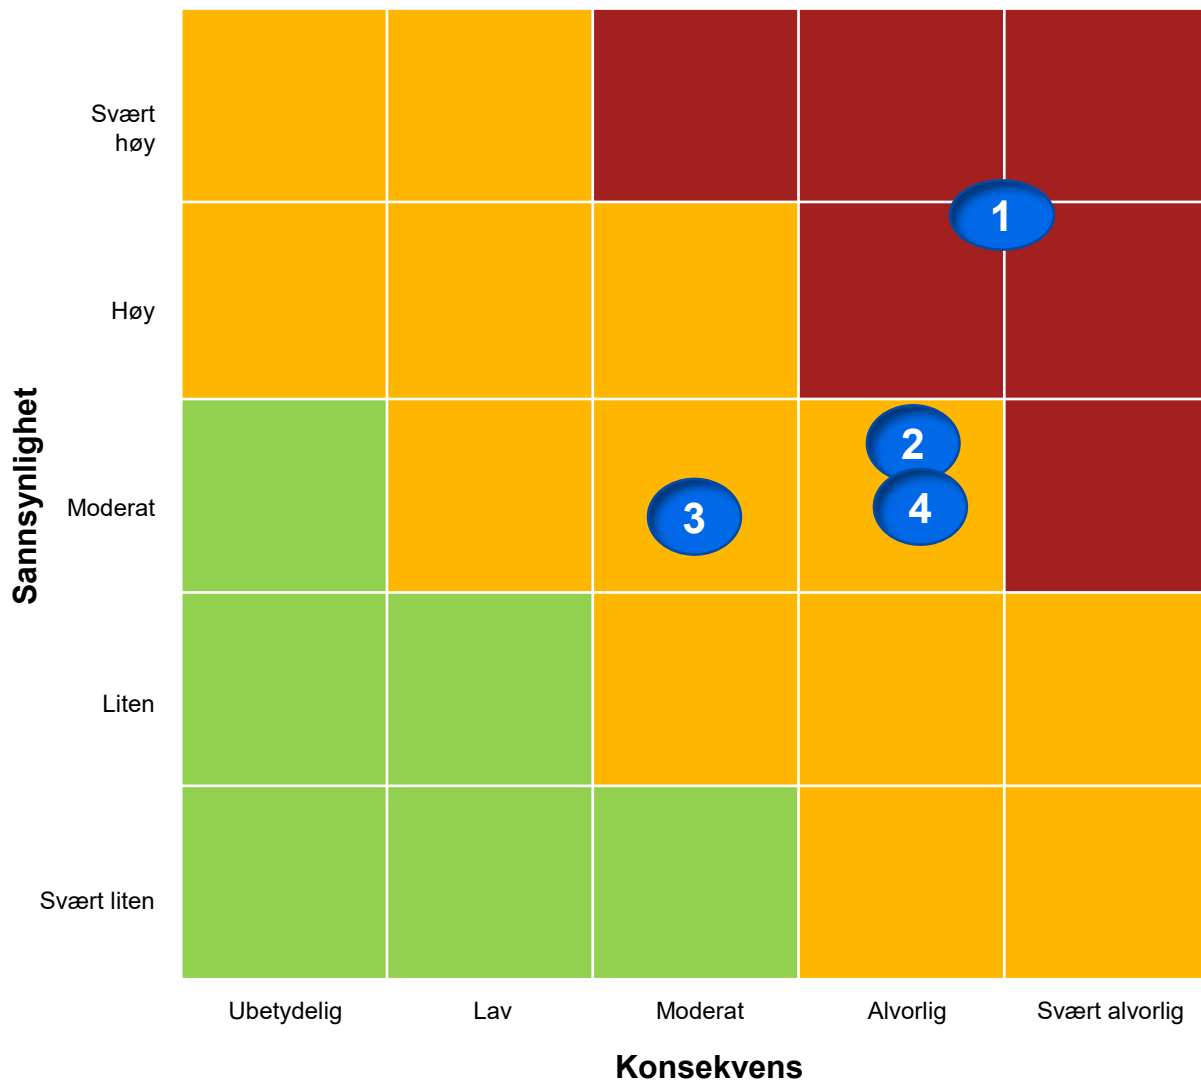

	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende interesse i sektoren for å ta i bruk DLR/ manglende delingskultur	Det pågår aktiviteter også utenfor prosjektet, med høyt ledelsesfokus for å sikre forankring hos KD og ledelse på institusjoner
2	Vedvarende behov for teknisk løft/vedlikehold og innføringsstøtte til nye institusjoner i flere år fremover for DLR	Vurdere mulige finansieringsmåter for videreutvikling av DLR
3	Avhengighet til NVA – DLR skal dele kjerne med NVA i fremtiden.	Viktig at man utvikler i samme retning. Arrangere en workshop med NVA
4	Oppfølging av potensielt nye institusjoner kan by på mye større omfang enn først antatt.	Sikre at vi lager en reell tidslinje for utrullings for institusjonene

