

<b>Prosjektnavn:</b>	Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte
<b>Ansvarlig virksomhet:</b>	Unit
<b>Prosjekteier:</b>	Anders Hansteen Reitan
<b>Prosjektleder:</b>	Ole Martin Nodenes
<b>Rapportdato</b>	15.10.2021

## Oppsummering

Prosjektet skal tilby data for Årsrapport til KD innenfor økonomi, lønn- og personal, utdanning og forskning gjennom en løsning som letter arbeidet med Årsrapport til KD for institusjonene og KD.


Prosjektet skal bidra til økt kvalitet i årsrapporteringen for sektoren ved at det utvikles en felles mal for årsrapporten som også tilfredsstillende ønsker fra KD. Institusjonene får oversikt over data som vil inngå i Årsrapport til KD lenge før de er rapportert til DBH gjennom tilgang til foreløpige nøkkeltall, slik at arbeidet med utarbeidelse av årsrapporten kan begynne tidligere.

Prosjektet ble vedtatt i Digitaliseringsstyret 9. juni og formell oppstart var 1. september. Eksterne ressurser tiltrådte 15. september. Prosjektgruppen er etablert og består av representanter for UiA, USN, Unit, Ernst & Young og Gartner. Styringsgruppen er etablert og har vedtatt prosjektplan.

	Forrige	Nå	Trend
<b>Fremdrift</b>	■	■	■
<b>Økonomi</b>	■	■	■
<b>Ressurser</b>	■	■	■
<b>Kvalitet</b>	■	■	■
<b>Avhengigheter</b>	■	■	■
<b>Risiko</b>	■	■	■

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosjektgruppen er i gang med 2-ukers sprinter. Prosjektet er i sprint 2.</li> <li>Prosjektgruppen har daglige standups</li> <li>Avholdt første møte i styringsgruppen og vedtatt prosjektplan</li> <li>Presentert prosjektet for KD og HK-dir.</li> <li>Etablert kontakt med KUDAF-prosjektet</li> <li>Innkalt 9 institusjoner til egne møter for å avklare brukerbehov</li> <li>Avholdt møte med personvernombud i Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stort engasjement og interesse til prosjektet</li> <li>Prosjektgruppen er bredt sammensatt og har kompetanse på relevante områder</li> <li>Trenger ikke vente på utvikling av infrastruktur fra KUDAF</li> <li>Er godt i gang med å dokumentere funksjonelle og ikke funksjonelle krav til analyseplattformen, samt kriterier for verktøyvalg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HK-dir har ikke signalisert ønske om en rolle i prosjektgruppen slik de ble invitert til</li> <li>Etter utskilling av Units Seksjon for jus og informasjonssikkerhet til HK-dir, er det vanskelig å få tilgang til personvernjurist for å kunne overholde krav til GDPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføring av tredje utviklings-sprint</li> <li>Ferdigstille dokumentasjon av funksjonelle og ikke funksjonelle krav til analyseplattformen</li> <li>Evaluerer verktøykandidater og velge verktøy for analyseplattformen</li> <li>Avklare deltakelse fra HK-dir</li> <li>Få tilgang til personvernjurist</li> </ul>

# Risikovurdering

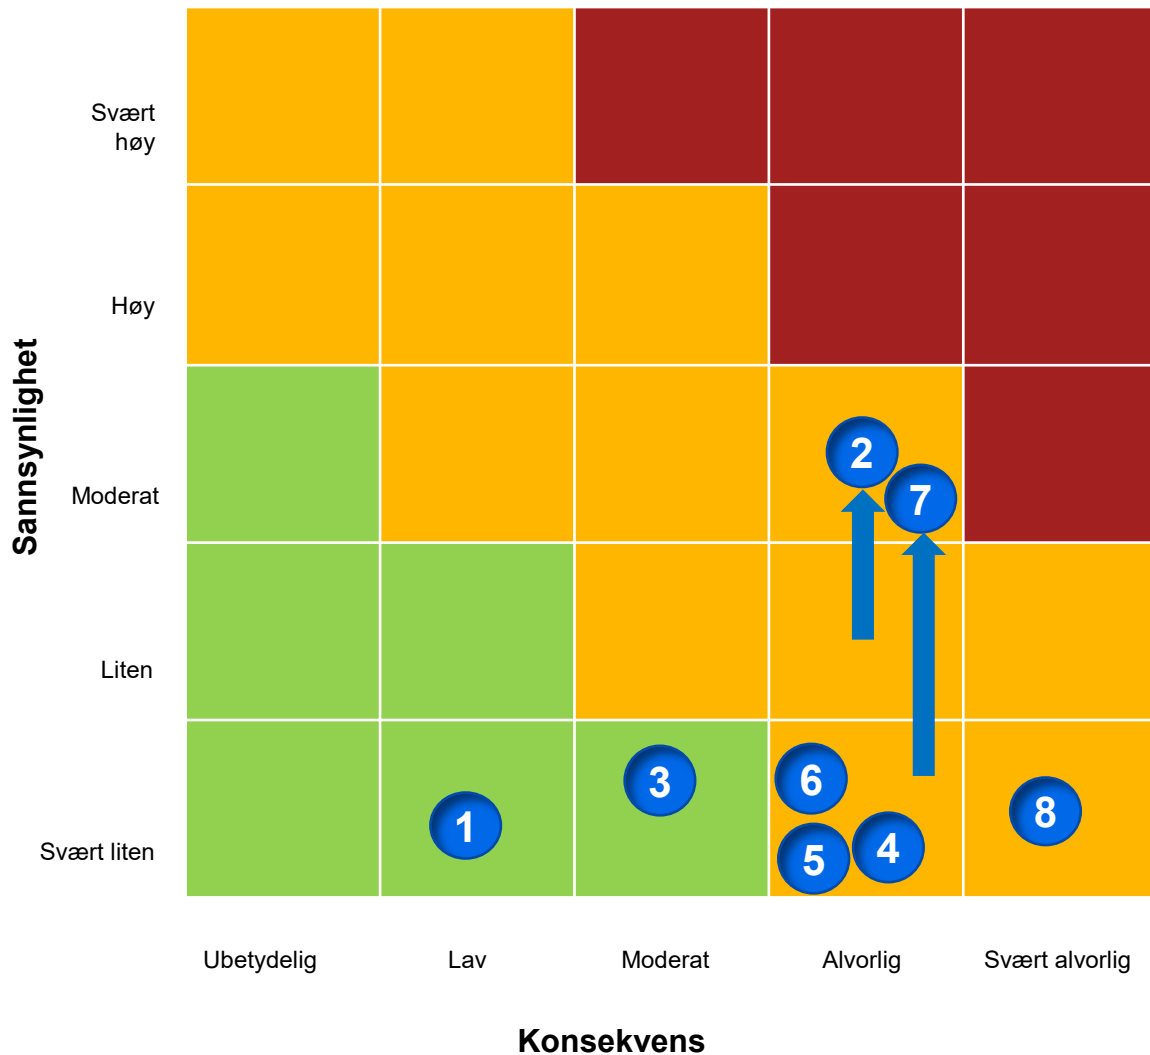

	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende fremdrift som følge av utilgjengelige ressurser	
2	Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger hindrer utvikling av etterspurt funksjonalitet	Ha tilgang til personvernjurist
3	Manglende brukerinnspill fra mottakere og brukere av Årsrapport til KD.	
4	Løsningen blir ikke brukt fordi den ikke treffer brukergruppen	2 pilot-institusjoner er representert i prosjektgruppen.
5	Institusjonene i sektoren utvikler eller kjøper egne analyse-løsninger pga. mangel på informasjon om prosjektet	
6	Uavklart rollefordeling og mangel på dialog med KUDAF-prosjektet	Jevnlige møter. Prosjektleder involvert i KUDAF-prosjektet
7	Manglende dialog med KD og HK-dir	Jevnlig dialog med KD og HK-dir med invitasjon til deltakelse/medvirkning
8	Institusjonene har ingen til å ta imot løsningen på institusjonsnivå og tar den ikke mot	Krav om mottaksprosjekt med gevinsteier på institusjoner som skal ta løsningen i bruk



## Avhengighet til KUDAF

Prosjektet *Kunnskapssektorens datafelleskap (KUDAF)* skal på sikt tilby infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Analyseplattformen. KUDAF har ikke etablert nødvendig infrastruktur enda, så inntil videre må prosjektet henvende seg til dataleverandørene for kildene prosjektet skal hente data fra.

## Avhengighet til Masterdatamanagement-prosjekter

- Ingen direkte avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkrete masterdatakilder når de foreligger.

## Avhengighet til HK-dir/DBH

- Prosjektet har behov for dialog med DBH som nå er organisert i HK-dir for å kunne gjenskape data som rapporteres til DBH i analyseplattformen.
- DBH vil være mottaker av data for Årsrapport til KD og må spesifisere hvordan dataformat for overlevering.

