

Prosjektnavn:	Fellestjeneste beslutningsstøtte planlegging
Ansvarlig virksomhet:	Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	11.03.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Oppsummering

30. januar 2020 tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til planlegging av prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er utført i Planleggingsfasen (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Samlet i *Mulighetsrommet* for tjenesten.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling. Overlappende med fagområdet økonomistyring i *Mulighetsrommet*. Datamodell kan innlemmes i tjenesten på et senere tidspunkt.
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky. 1 PoC og test av ulike verktøy.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument. Utkast til styringsdokument diskutert i Digitaliseringsstyret 19. november.


Våren 2021 vil prosjektet identifisere, tydeliggjøre og forankre prosjektets gevinster. I tillegg vil det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen har hatt 5 møter • Utkast til Styringsdokument lagt frem til orientering for Digitaliseringsstyret i november 2020, • Arbeid med verdikjedevurdering, storytelling og identifisering av gevinster er godt i gang • Første tilbakemelding fra Ekstern kvalitetssikring 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiv stemning i prosjektgruppen og styringsgruppen • Fagutvalget har fulgt prosjektet tett • Etablert og forankret <i>Mulighetsrom</i> • Samarbeid med prosjektene <i>Datadeling</i> i UH-sektoren og <i>KuDaF – Kunnskapssektorens datafelleskap</i>. • Strukturendring i kunnskapssektoren kan skape muligheter • 2 institusjoner ønsker å pilotere løsningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Flere pågående prosjekter/initiativer berører prosjektet, men dialog er nå opprettet med flere av prosjektene. • Strukturendring, og spesielt fremtidig organisering av DBH og beslutningsstøtte-miljøet i Unit, kan begrense gevinstuttak fra første fase i prosjektet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedre og forankre verdikjedeanalyse og storytelling for prosjektet • Utarbeide og forankre gevinstoversikt/gevinstrealiseringsplan i prosjektgruppen og 2 institusjoner • Revidere styringsdokument på bakgrunn av tilbakemelding fra Ekstern kvalitetssikring

Avhengigheter til Datadelingsprosjekter i kunnskapssektoren	Avhengigheter til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT	Avhengighet til Masterdatamanagement-prosjekter
<p>Prosjektene <i>Datadeling</i> og <i>Kunnskapssektorens datafellesskap</i> kan tilby infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Fellestjeneste beslutningsstøtte. Avhengighet vil ev. oppstå i gjennomføringsfase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Overlapp for fagområdet <i>Økonomistyring</i> i det definerte <i>Mulighetsrommet</i> for tjenesten. Ingen avhengighet, men bl.a. datamodellering fra prosjektet kan ev. gjenbrukes av <i>Fellestjeneste beslutningsstøtte</i> i en senere fase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen direkte avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkrete masterdatakilder når de foreligger.



Risikovurdering

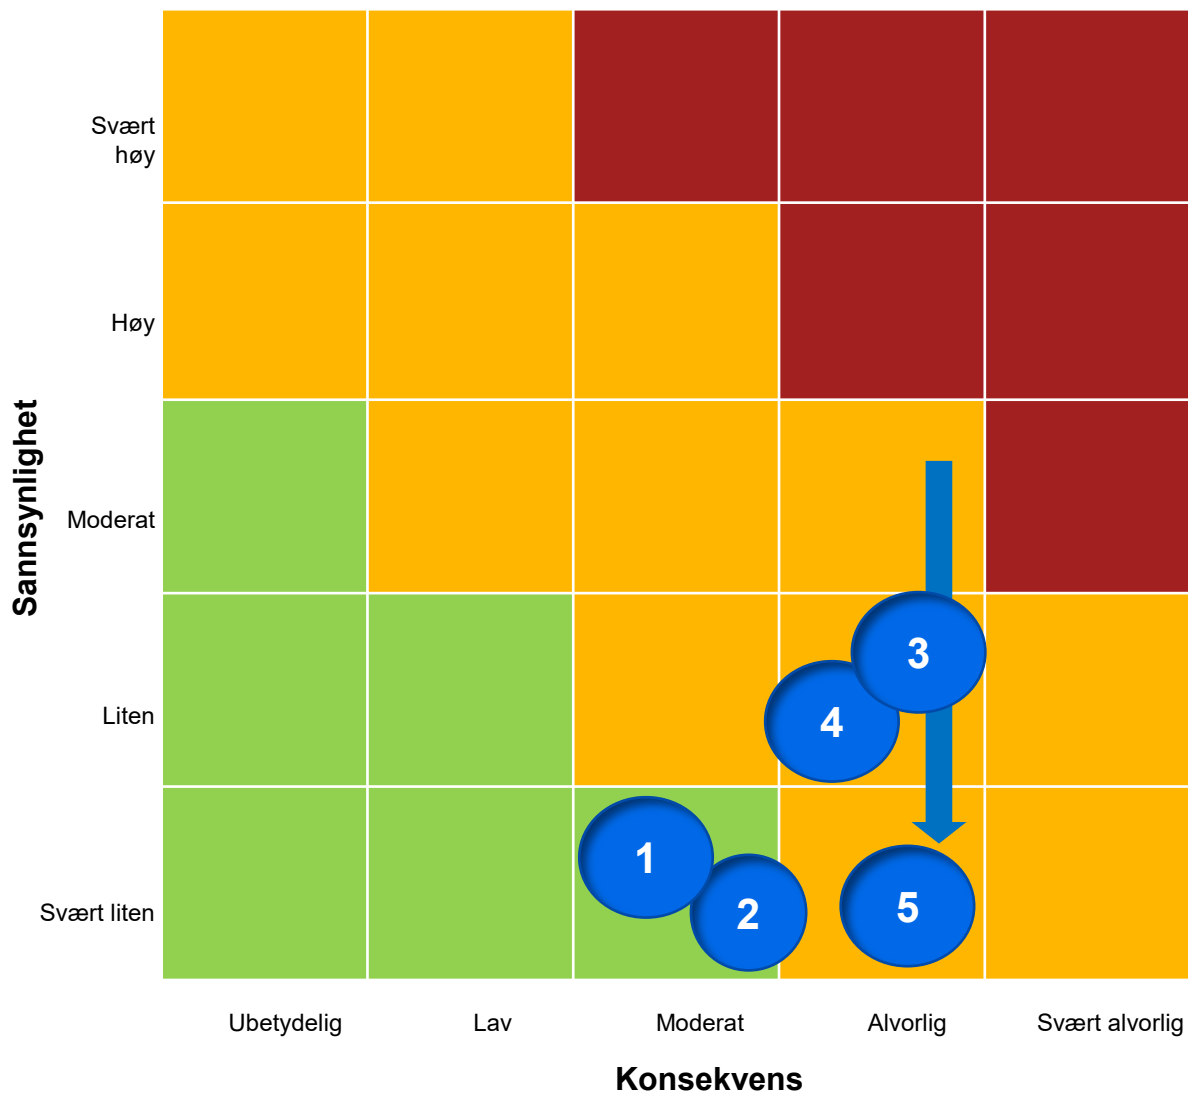

	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov	
2	Manglende ressurser i prosjektet	
3	Manglende fremdrift i prosjektet	
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag	Samarbeid med KuDaf-prosjektet
5	Mangel på institusjon som ambassadør før prosjektet	UiA og USN har ønsket å være piloter i fase 1
6		
7		
8		
9		
10		

