

Prosjektnavn:	Fellestjeneste beslutningsstøtte planlegging
Ansvarlig virksomhet:	Unit – Avdeling for administrative tjenester og strategisk innkjøp
Prosjekteier:	Anders Hansteen Reitan
Prosjektleder:	Ole Martin Nodenes
Rapportdato	12.02.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Yellow	Yellow
Økonomi	Green	Yellow	Yellow
Ressurser	Green	Green	Green
Kvalitet	Green	Green	Green
Avhengigheter	Green	Yellow	Yellow
Risiko	Green	Yellow	Yellow

Oppsummering

30. januar 2020 tildelte Digitaliseringsstyret 1,5 million NoK til planlegging av prosjektet *Fellestjeneste beslutningsstøtte*.

Følgende aktiviteter er utført i Planleggingsfasen (2020):

- Beskrive de mest sentrale datasettene og datakildene som skal tilbys gjennom fellesløsningen på kort og mellomlang sikt. Samlet i *Mulighetsrommet* for tjenesten.
- Utrede prosjektets forhold til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT, som er under utvikling. Overlappende med fagområdet økonomistyring i *Mulighetsrommet*. Datamodell kan innlemmes i tjenesten på et senere tidspunkt.
- Prototyping og uttesting av datavarehus i sky. PoC gjennomført med datavarehus i sky. 1 PoC og test av ulike verktøy.
- Prosjektplanlegging mot BP3, inkludert institusjonsrekkefølge ved implementering, klarere kostnadsestimater og vedtatt Styringsdokument. Utkast til styringsdokument diskutert i Digitaliseringsstyret 19. november.


Våren 2021 vil prosjektet tydeliggjøre og forankre prosjektets gevinster. I tillegg vil det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen har hatt 5 møter • Utkast til Styringsdokument lagt frem til orientering for Digitaliseringsstyret i november, etter gjennomgang i styringsgruppe, Fagutvalg og Råd for helhetlig prioritering • Arbeid med verdikjedevurdering, storytelling og gevinstavklaring startet • Ekstern kvalitetssikring igangsatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiv stemning i prosjektgruppen og styringsgruppen • Fagutvalget har fulgt prosjektet tett • Etablert og forankret <i>Mulighetsrom</i> • Samarbeid med prosjektene <i>Datadeling</i> i UH-sektoren og <i>KuDaF – Kunnskapssektorens datafellesskap</i>. • Strukturendring i kunnskapssektoren kan skape økte muligheter for realisering av prosjektets effektmål 	<ul style="list-style-type: none"> • Flere pågående prosjekter/initiativer berører prosjektet, men dialog er nå opprettet med flere av prosjektene. • Manglende ambassadører for prosjektet i Digitaliseringsstyret • Strukturendring, og spesielt fremtidig organisering av DBH og beslutningsstøtte-miljøet i Unit, kan begrense gevinstuttak fra prosjektet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide og forankre verdikjedeanalyse og storytelling for prosjektet • Utarbeide og forankre gevinstoversikt/gevinstrealiseringsplan og usikkerhetsvurdering • Ekstern kvalitetssikring

Avhengigheter til Datadelingsprosjekter i kunnskapssektoren	Avhengigheter til datavarehuset DV-UiB-UiO-UiT	Avhengighet til Masterdatamanagement-prosjekter
<p>Prosjektene <i>Datadeling</i> og <i>Kunnskapssektorens datafellesskap</i> kan tilby infrastruktur og rammebetingelser for tilgjengeliggjøring av data for Fellestjeneste beslutningsstøtte. Avhengighet vil ev. oppstå i gjennomføringsfase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Overlapp for fagområdet <i>Økonomistyring</i> i det definerte <i>Mulighetsrommet</i> for tjenesten. Ingen avhengighet, men bl.a. datamodellering fra prosjektet kan ev. gjenbrukes av <i>Fellestjeneste beslutningsstøtte</i> i en senere fase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen direkte avhengighet. Fellestjenesten vil nyttiggjøre seg konkrete masterdatakilder når de foreligger.



Risikovurdering

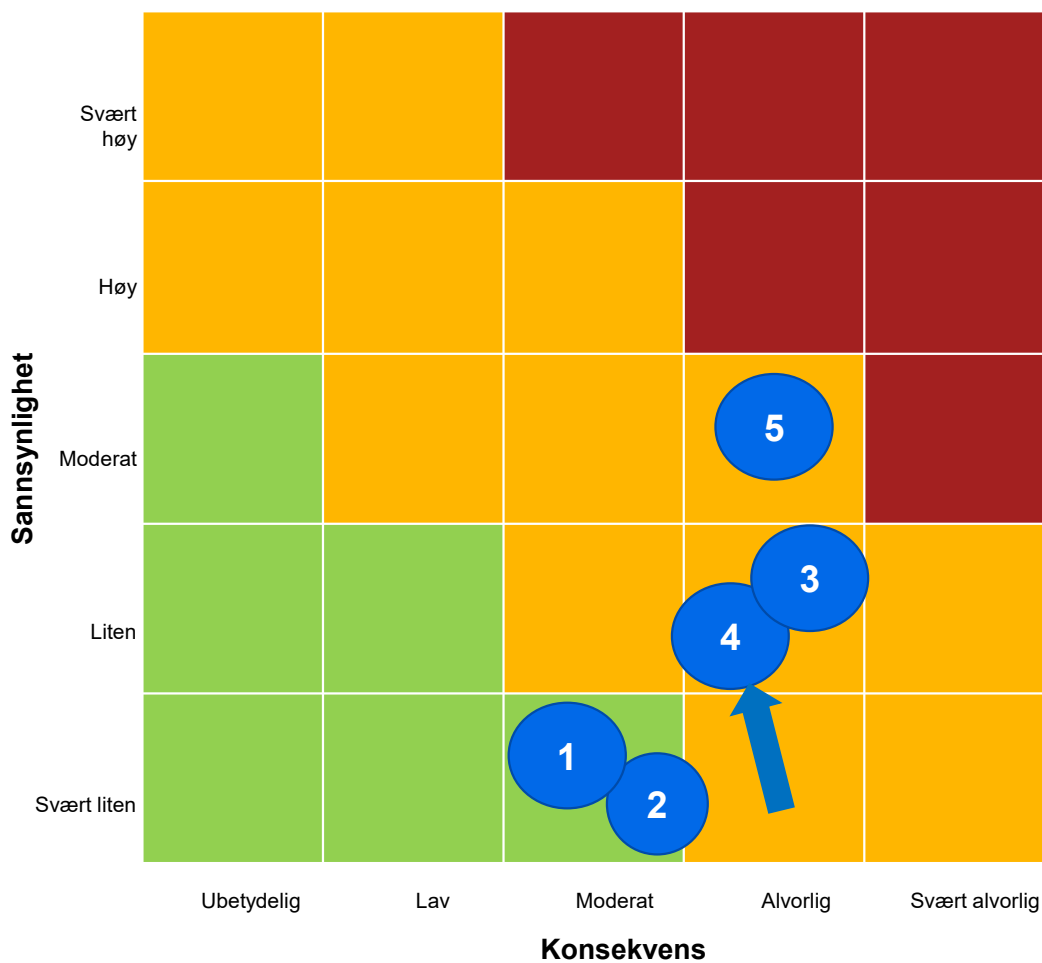

	Risikoelementer	Tiltak
1	Manglende forankring i sektoren for deres behov	
2	Manglende ressurser i prosjektet	
3	Manglende fremdrift i prosjektet	
4	Ikke tilstrekkelig økonomi i prosjektet til å få et godt prosjektgrunnlag	Samarbeid med KuDaf-prosjektet
5	Mangel på institusjon som ambassadør før prosjektet	Dialog med USN i arbeid med verdikjedevurdering og gevinstoversikt.
6		
7		
8		
9		
10		

